





УСЛОВЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
 Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с ПГР през 2015 година - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

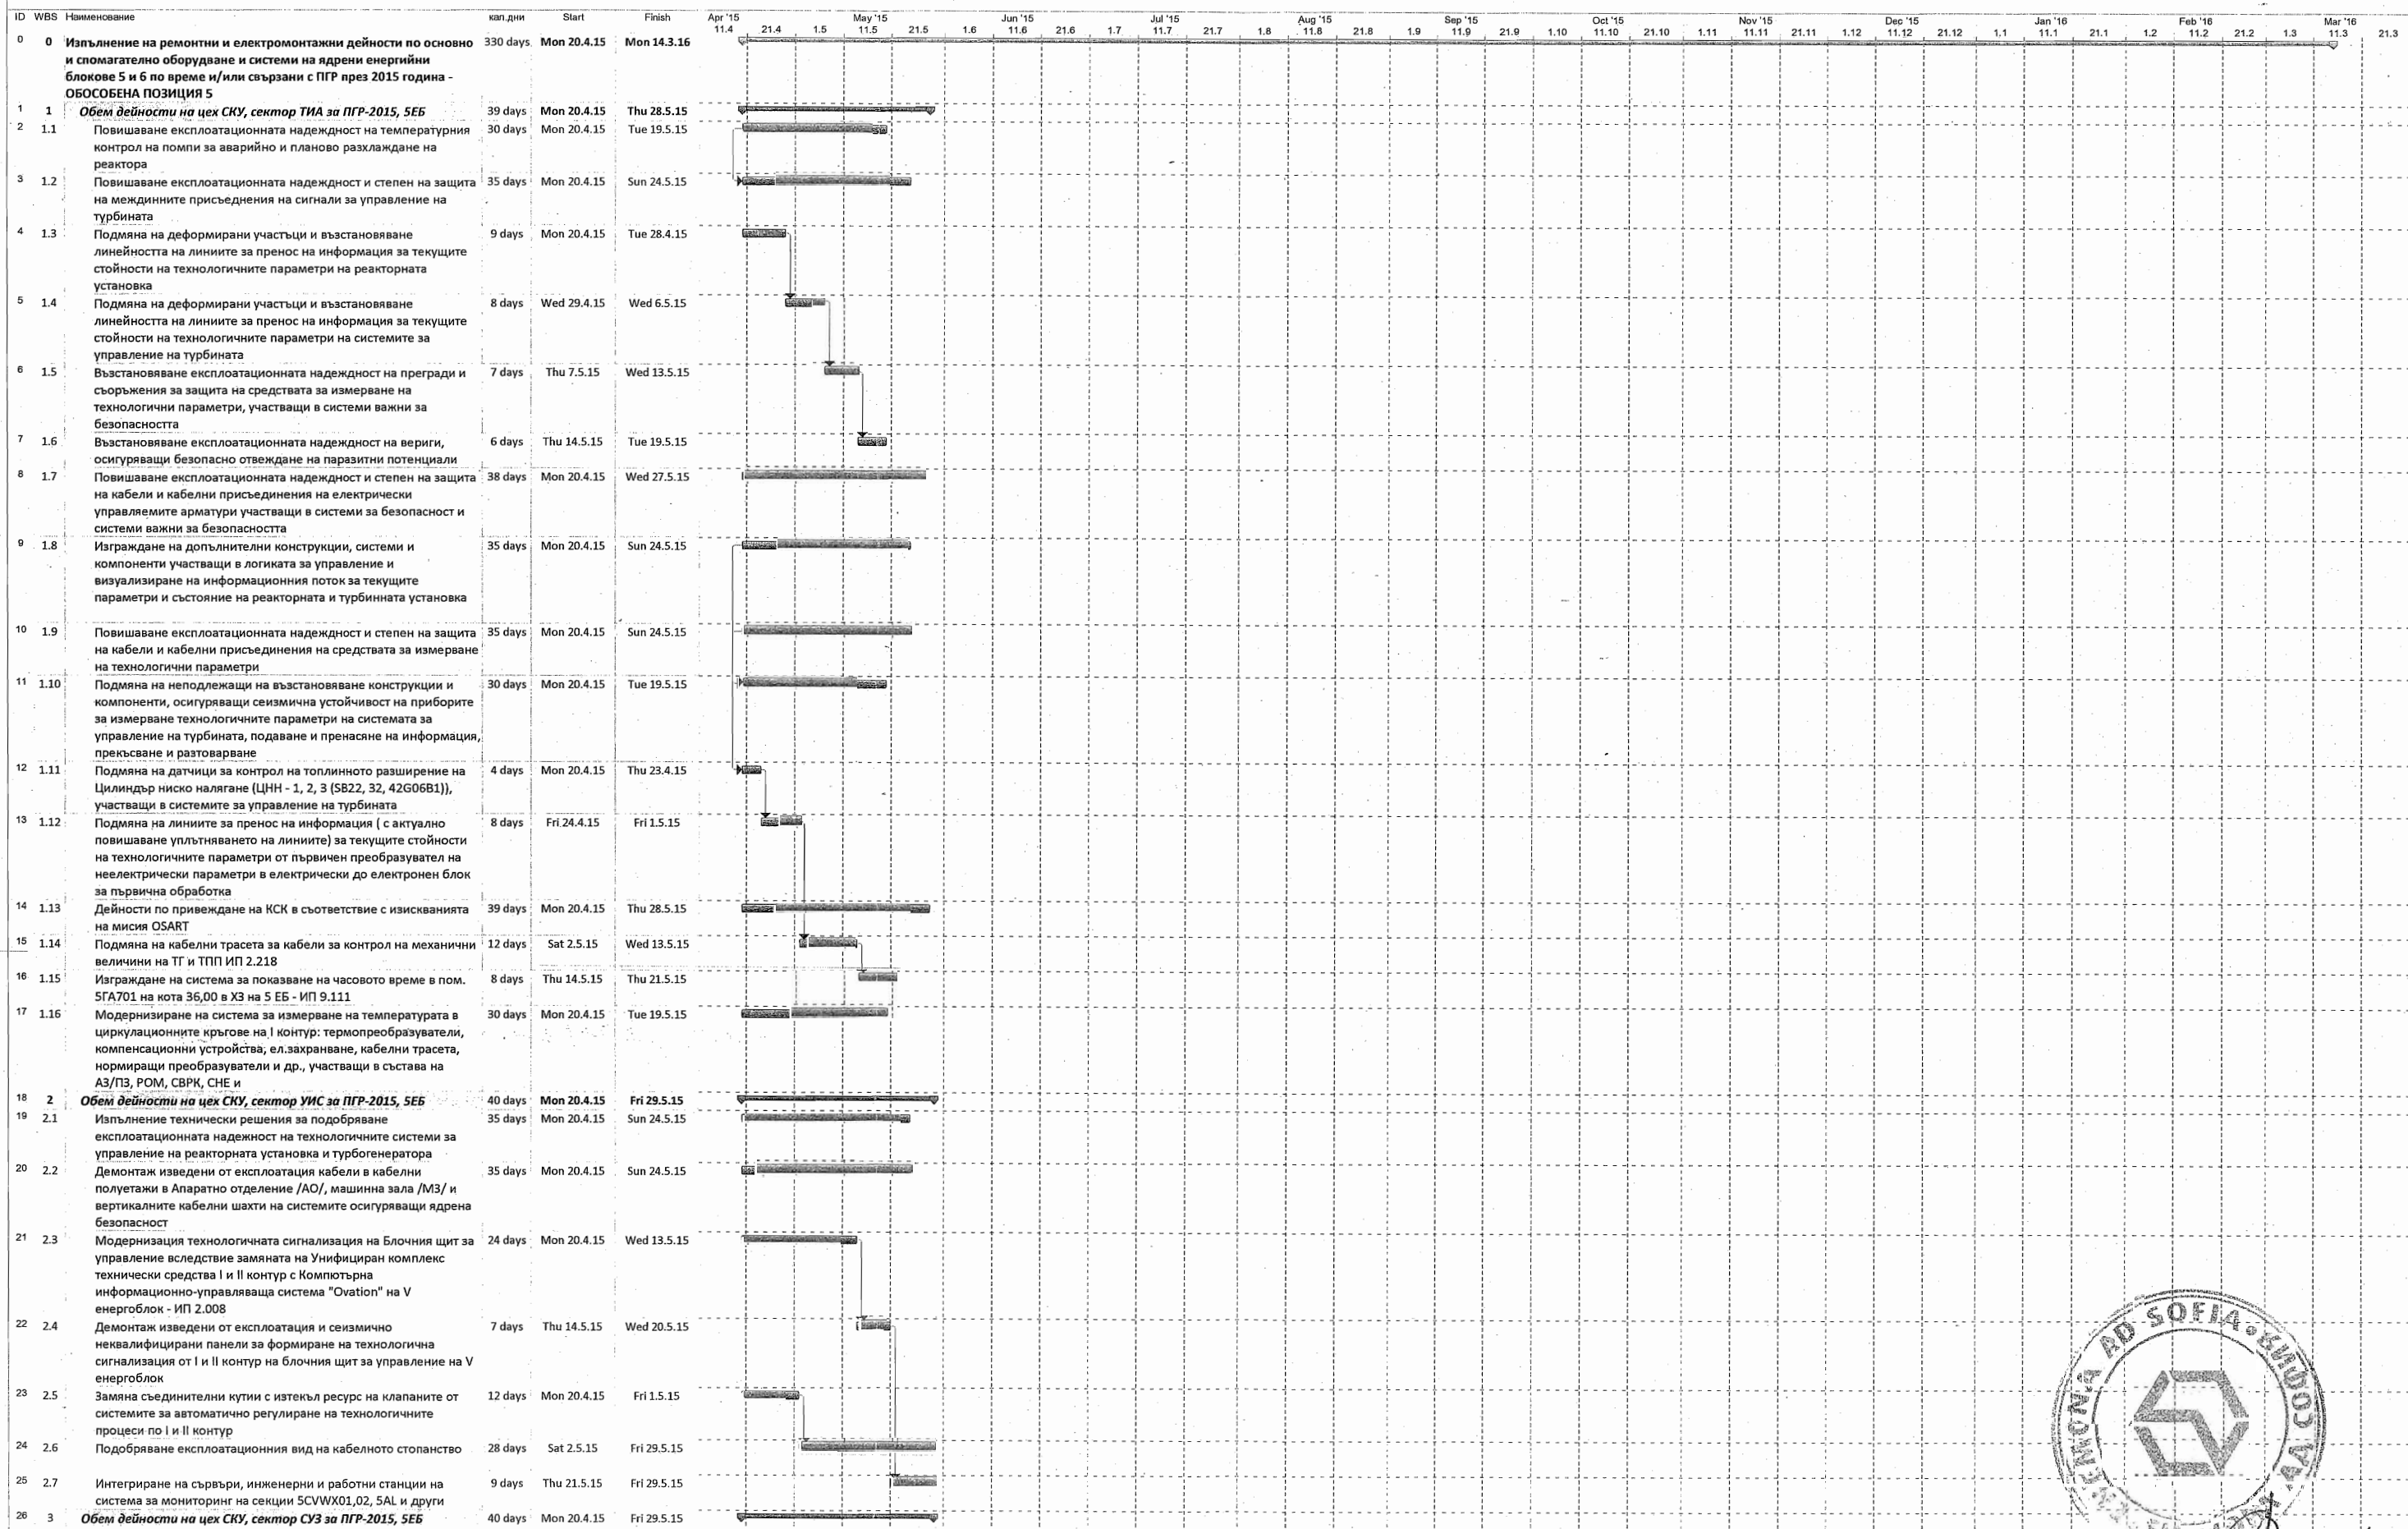

Подпис и Печат: /инж. Богдан Прокопиев
 Изп. Директор "Енемона" АД/

УСЛОВЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
 Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с ПГР през 2015 година - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

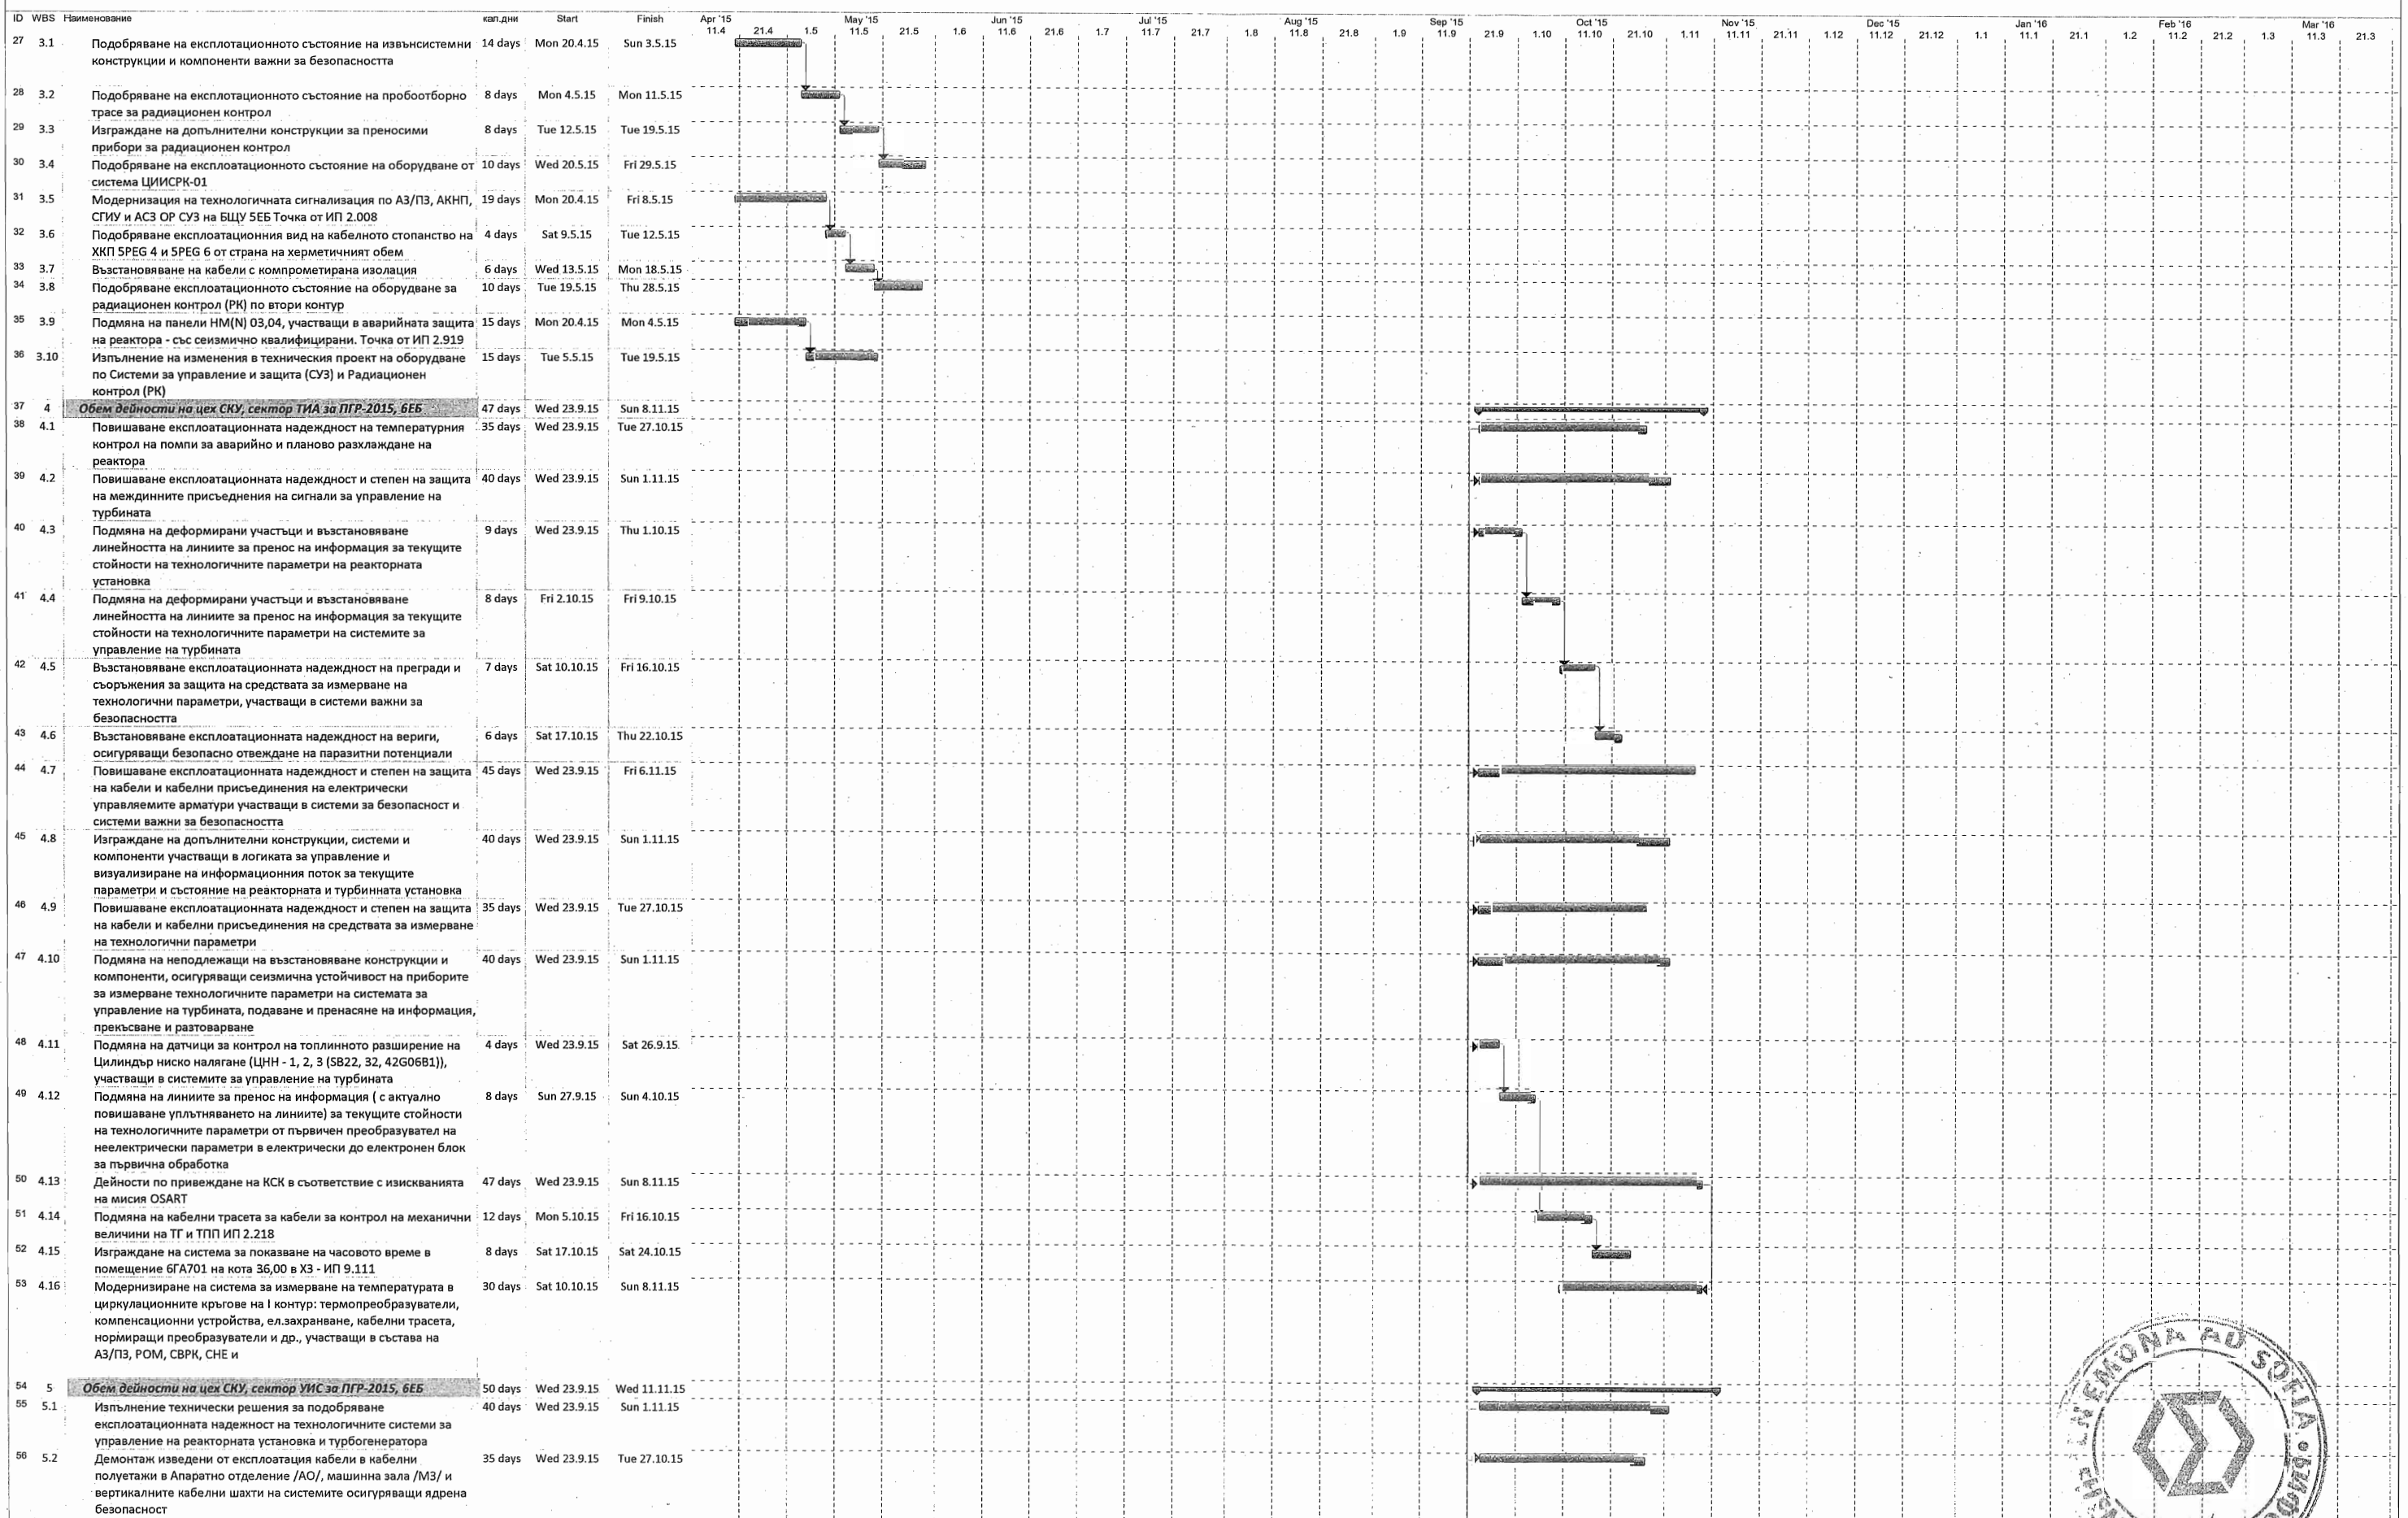

Подписан:  Иван Богдан Прокопиев
 Главен Директор "Енемона" АД


УСЛОВЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
 Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с ПГР през 2015 година - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

ID	WBS	Наименование	кал. дни	Start	Finish	Apr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Aug '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dec '15	Jan '16	Feb '16	Mar '16
						11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.1	11.2	11.3
57	5.3	Модернизация технологичната сигнализация на Блочния щит за управление вследствие замената на Унифициран комплекс технически средства I и II контур с Компютърна информационно-управляваща система "Ovation" на V енергоблок - ИП 2.008	25 days	Wed 23.9.15	Sat 17.10.15												
58	5.4	Демонтаж изведени от експлоатация и сеизмично невалифицирани панели за формиране на технологична сигнализация от I и II контур на блочния щит за управление на VI енергоблок	8 days	Sun 18.10.15	Sun 25.10.15												
59	5.5	Замяна съединителни кутии с изтекъл ресурс на клапаните от системите за автоматично регулиране на технологичните процеси по I и II контур	15 days	Wed 23.9.15	Wed 7.10.15												
60	5.6	Подобряване експлоатационния вид на кабели и кабелни трасета	35 days	Thu 8.10.15	Wed 11.11.15												
61	5.7	Интегриране на сървъри, инженерни и работни станции на система за мониторинг на секции 6CVWX01,02, 6AL и други	10 days	Mon 26.10.15	Wed 4.11.15												
62	6	Обем дейности на цех СКУ, сектор СУЗ за ПГР-2015, БЕБ	40 days	Wed 23.9.15	Sun 1.11.15												
63	6.1	Подобряване на експлоатационното състояние на пробоотборно трасе за радиационен контрол	8 days	Wed 23.9.15	Wed 30.9.15												
64	6.2	Подобряване на експлоатационното състояние на пробоотборно трасе за радиационен контрол	8 days	Thu 1.10.15	Thu 8.10.15												
65	6.3	Изграждане на допълнителни конструкции за преносими прибори за радиационен контрол	8 days	Fri 9.10.15	Fri 16.10.15												
66	6.4	Подобряване на експлоатационното състояние на оборудване от система ЦИИСПК-01	11 days	Sat 17.10.15	Tue 27.10.15												
67	6.5	Модернизация на технологичната сигнализация по АЗ/ПЗ, АKNП, СГИУ и АСЗ ОР СУЗ на БЩУ БЕБ Точка от ИП 2.008	20 days	Wed 23.9.15	Mon 12.10.15												
68	6.6	Подобряване експлоатационния вид на кабелното стопанство на ХКП БРЕГ 4 и БРЕГ 6 от страна на	4 days	Tue 13.10.15	Fri 16.10.15												
69	6.7	Възстановяване на кабели с компрометирана изолация	6 days	Sat 17.10.15	Thu 22.10.15												
70	6.8	Подмяна на панели НМ(N) 03,04, участващи в аварийната защита на реактора - със сеизмично квалифицирани. Точка	15 days	Wed 23.9.15	Wed 7.10.15												
71	6.9	Изпълнение на изменения в техническия проект на оборудване по Системи за управление и защита (СУЗ) и	15 days	Thu 8.10.15	Thu 22.10.15												
72	6.10	Подобряване експлоатационното състояние на оборудване за радиационен контрол (РК) по втори контур	10 days	Fri 23.10.15	Sun 1.11.15												
73	7	Обем дейности на цех СКУ, сектор ТИА за ПГР-2015, ОСО	288 days	Mon 1.6.15	Mon 14.3.16												
74	7.1	Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и кабелни присъединения на електрически управляемите арматури	277 days	Mon 1.6.15	Thu 3.3.16												
75	7.2	Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в логиката за управление и визуализиране на информационния поток за текущите параметри	267 days	Thu 11.6.15	Thu 3.3.16												
76	7.3	Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия OSART	277 days	Thu 11.6.15	Sun 13.3.16												
77	7.4	Реконструкция на слаботоквата и оптична кабелни мрежи на площадката на ЕП2 свързано с обособяването на комуникационния възел на ЕП 2 като основен - ИП 9.117	31 days	Wed 1.7.15	Fri 31.7.15												
78	7.5	Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на кабели и кабелни присъединения на средствата за измерване на технологични параметри. Подмяна на кабели на датчици и съединителни кутии	248 days	Sun 21.6.15	Tue 23.2.16												
79	7.6	Интерфейс между нереализираните проекти за получаване на една интегрирана система за контрол и управление на СК-3 ИП 2.853	12 days	Thu 3.3.16	Mon 14.3.16												
80	8	Обем дейности на цех СКУ, сектор УМС за ПГР-2015, ОСО	257 days	Sun 21.6.15	Thu 3.3.16												
81	8.1	Изпълнение технически решения за изменения в проекта по технологичните системи на корпуса за специална водоочистка	52 days	Sun 1.11.15	Tue 22.12.15												
82	8.2	Замяна съединителните кутии с изтекъл ресурс на клапаните от системите за автоматично регулиране на технологичните процеси в корпуса за специална водоочистка	257 days	Sun 21.6.15	Thu 3.3.16												
83	8.3	Подобряване експлоатационния вид на кабели и кабелни трасета	247 days	Wed 1.7.15	Thu 3.3.16												
84	9	Обем дейности на цех СКУ, сектор СУЗ за ПГР-2015, ОСО	45 days	Sun 21.6.15	Tue 4.8.15												
85	9.1	Подобряване на експлоатационното състояние на пробоотборно трасе за радиационен контрол СКЗ	8 days	Sat 11.7.15	Sat 18.7.15												
86	9.2	Изграждане на допълнителни конструкции за преносими прибори за радиационен контрол	8 days	Sun 21.6.15	Sun 28.6.15												
87	9.3	Подобряване на експлоатационното състояние на оборудване от с-ма ЦИИСПК-01	11 days	Sun 21.6.15	Wed 1.7.15												
88	9.4	Подобряване на експлоатационното състояние на автономни прибори за РК	6 days	Sat 11.7.15	Thu 16.7.15												
89	9.5	Подобряване на експлоатационното състояние на монитори за повърхностно замърсяване РУСИ-1	6 days	Sat 11.7.15	Thu 16.7.15												
90	9.6	Изпълнение на изменения в техническия проект на оборудване по Системи за управление и защита (СУЗ) и Радиационен контрол (РК)	12 days	Tue 21.7.15	Sat 1.8.15												
91	9.7	Възстановяване на проектите характеристики на монитори за радиационен мониторинг в СКЗ	4 days	Sat 1.8.15	Tue 4.8.15												

Подпис и Печат:
 Искр. Богдан Прокопиев
 Изд. Директор "Енемона" АД/

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с ПГР през 2015 година - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

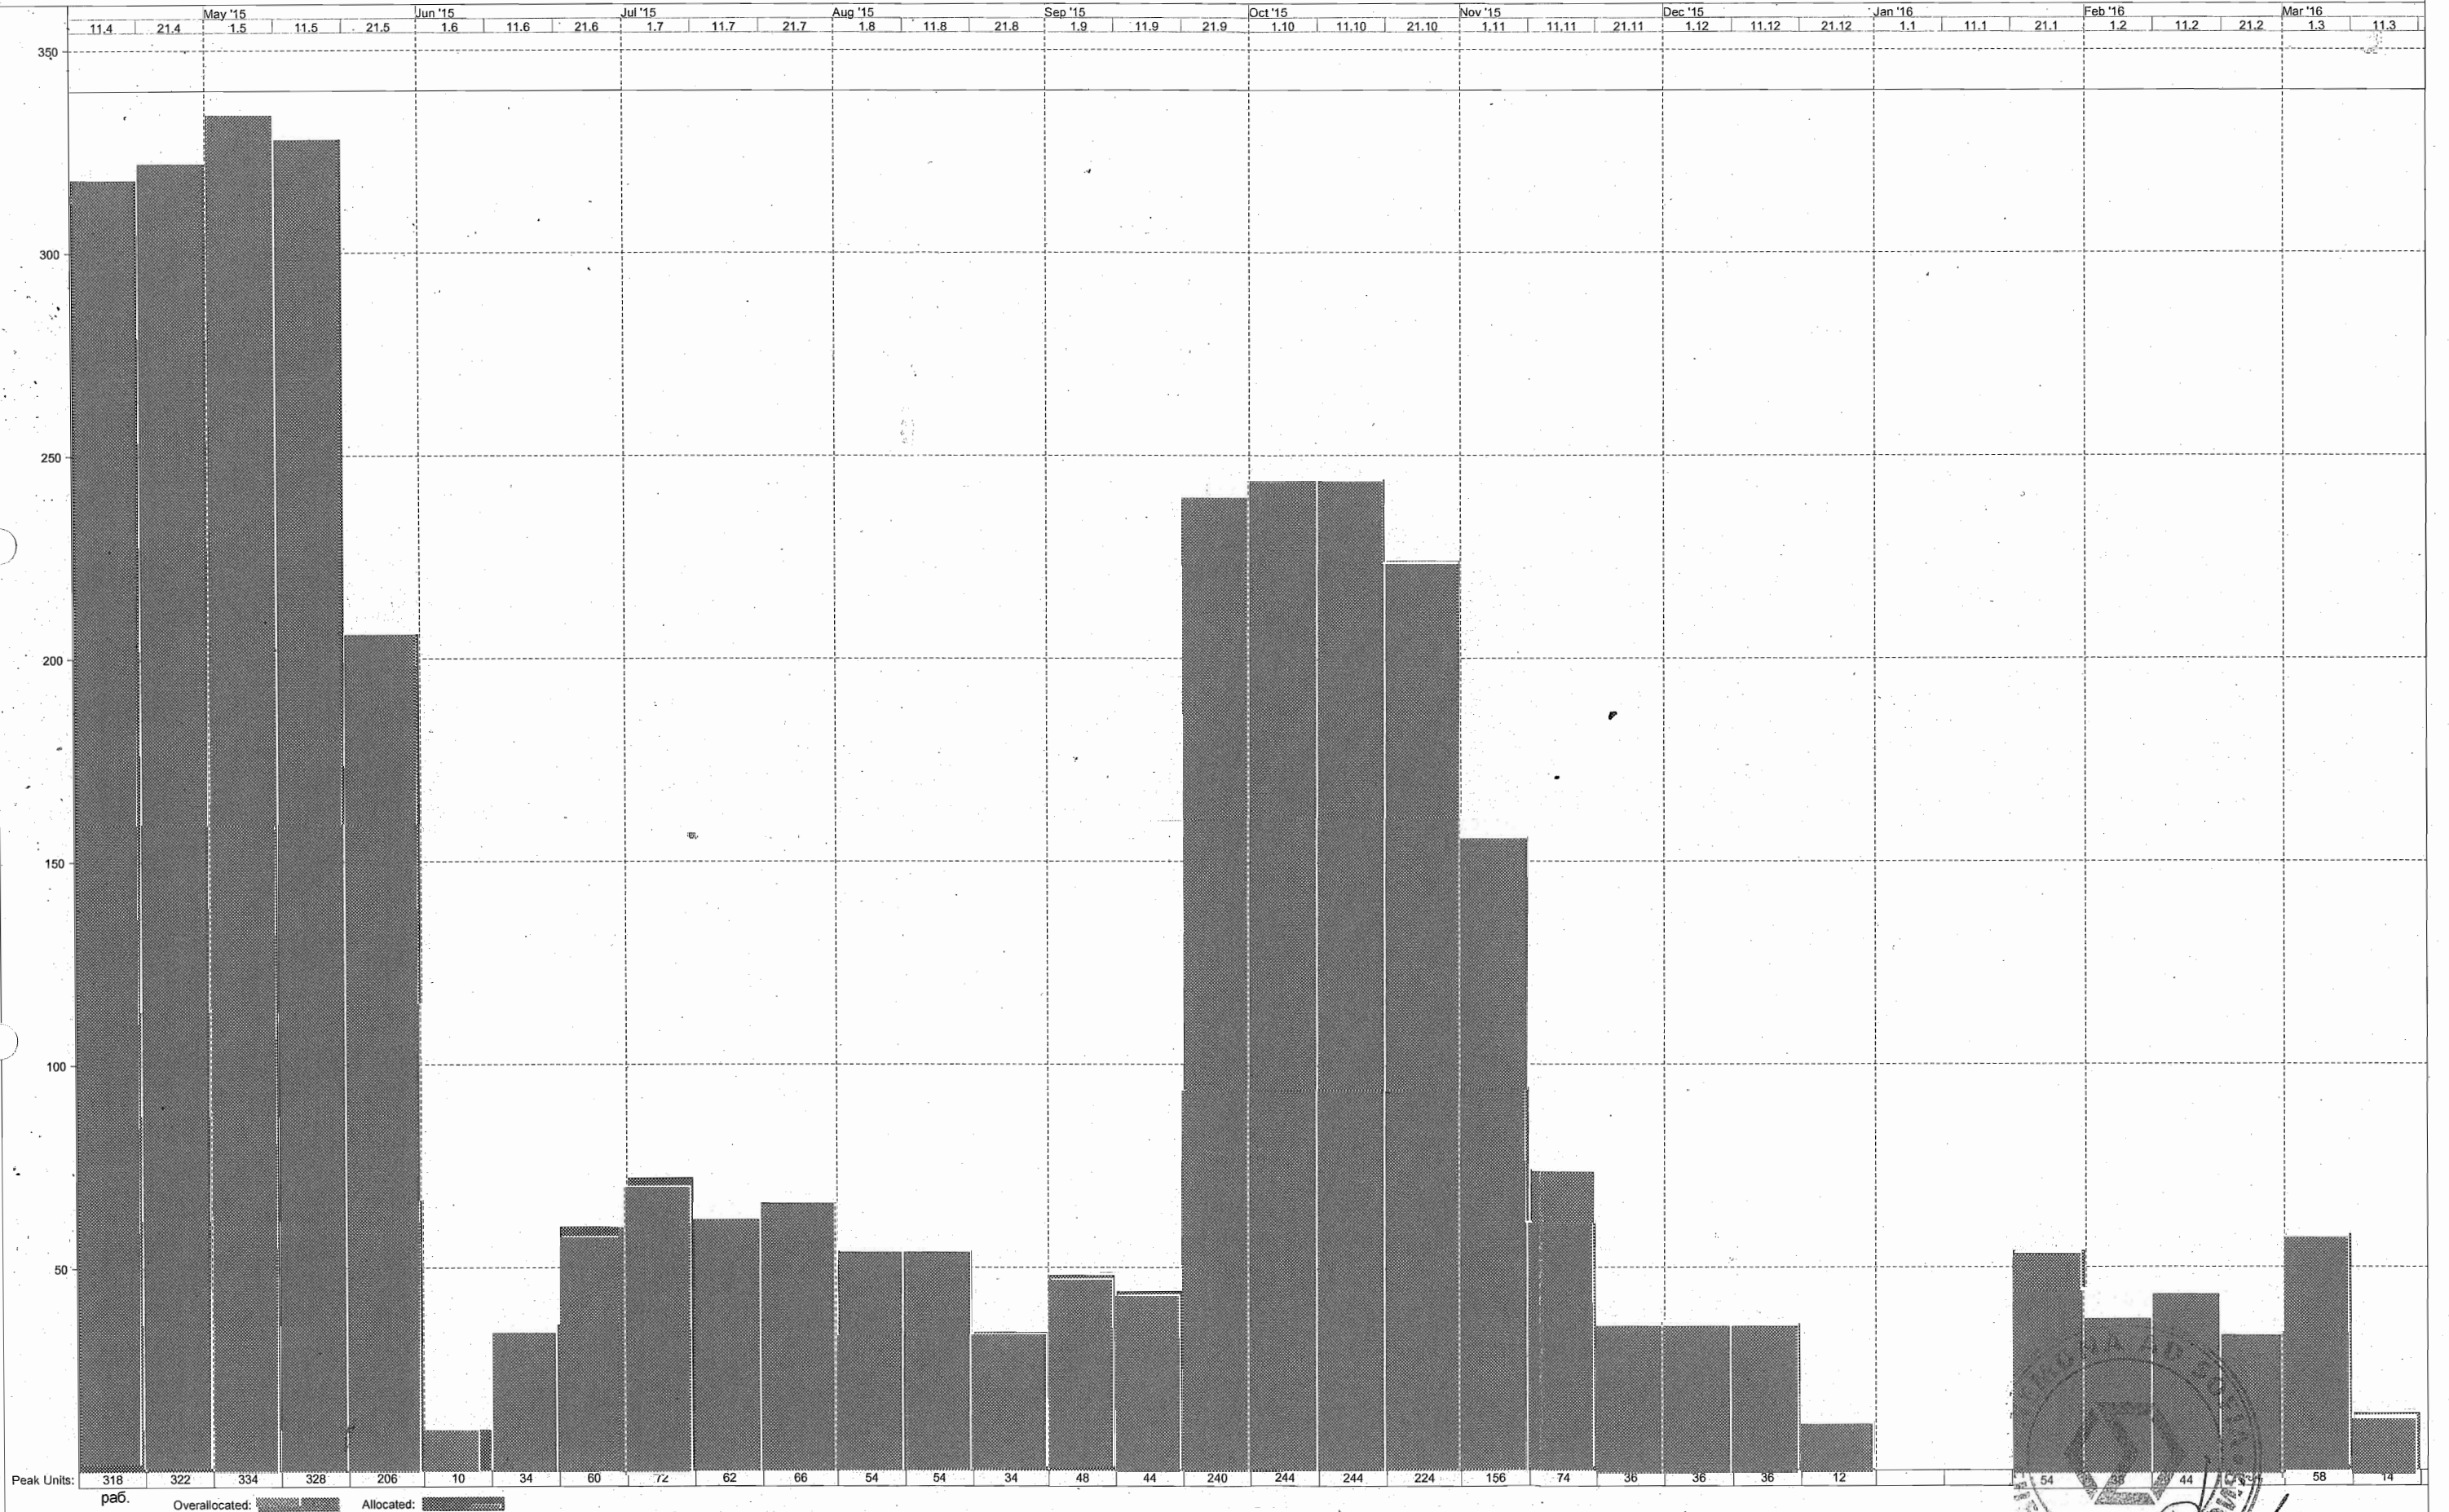

Peak Units: 318 322 334 328 206 10 34 60 72 62 66 54 54 34 48 44 240 244 244 224 156 74 36 36 36 12 54 38 44 34 58 14

раб. Overalllocated: Allocated:

Stamp: БУРГАСКА АТОМНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Signature: /инж. Богдан Прокопиев
Исп. Директор "Енемона" АД/
